



МВД России

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ
(ВИ МВД России)**

пр-т Патриотов, 53, Воронеж, 394065

тел./факс 247-67-07; 262-33-77

E-mail: mail@vimvd.ru

D-mail: vshmc@vor.mvd.ru

http://www.vimvd.ru

05.10.2012 № 3103
на № _____ от _____

Директору НП СРО
«Межрегиональное объединение
строительных и монтажных
организаций «Стройкорпорация»

И.Э. Лукину

Славянская ул., д.2, микрорайон
«Междуречье» г. Пушкино,
Московская область, 141204

Уважаемый Игорь Эдуардович!

30.07.2012 г. по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме между ВИ МВД России и ООО «Новый дом» был заключен государственный контракт №45 на предмет капитального ремонта помещений столовой.

Согласно п. 9.2. настоящего государственного контракта срок выполнения работ на ремонт внутренних помещений истек 28.08.2012 г., а срок выполнения работ по наружной отделке истек 28.09.2012 г. Однако ООО «Новый дом» по настоящее время не выполнил полный объем работ в соответствии с техническим заданием и не исполнил обязательства Подрядчика, предусмотренные п.п.4.1.1, 4.1.2, 4.1.8, 4.1.10 настоящего контракта.

Прошу оказать содействие по исполнению ООО «Новый дом» своих обязательств перед Заказчиком.


Начальник
генерал-майор полиции


А.В. Симоненко

Александр Викторович

Вход. № 2390-12
25.10.2012
подпись

Казаров



Вице-президенту
НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация»
С.Г. Пятибратову

«29» октября 2012г.
№ 42/ВФ-И

Довожу до Вашего сведения, что Воронежским филиалом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» была проведена проверка в отношении исполнения Государственного контракта № 45 от 30.07.2012 между ООО «Новый дом» (член НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») и ВИ МВД России.

В ходе проверки выяснилось следующее:

- в процессе производства работ, выполняемых организацией ООО «Новый дом» возникло множество дополнительных работ инициированных Заказчиком, что отражено в объяснительном письме ООО «Новый дом».

3 октября 2012 г был составлен и подписан с обеих сторон список замечаний (по своей сути незначимых).

5 октября 2012 г начальник института Симоненко А.В. подписал письмо и оно было отправлено в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (на имя И.Э. Лукина).

9 октября 2012 г ООО «Новый дом» сдал в секретариат акты выполненных работ и всю исполнительную документацию (было принято и подписано о получении секретарем). Замечания на этот момент были устранены на 80 %. Официального ответа или какой-либо реакции со стороны Заказчика на сданную документацию до сих пор не последовало.

На 26 октября 2012 г все замечания устранены полностью в соответствии с реестром замечаний, подписан протокол со стороны заказчика.

29 октября 2012 г состоится встреча с ответственным исполнителем от Заказчика Гасиным В.П. и Кулаковым И.А. по вопросам подписания актов выполненных работ.

Считаю, что информация, содержащаяся в письме начальника института не актуальна на сегодняшний день и нацелена на нежелания оплачивать дополнительные работы, затянуть приемку выполненных работ.

Приложение: Сопроводительное письмо о сдаче актов о приемке выполненных работ в секретариат.
Объяснительное письмо от ООО «Новый дом»

Директор Воронежского филиала
НП СРО МОСМО
«СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»

К.В. Кисиль

«1» ноября 2012г.
№ 328-12

394065, г. Воронеж,
проспект Патриотов, дом 53.

Уважаемый Александр Викторович!

В ответ на Ваше письмо от 05.10.2012г. № 3103 по срокам выполнения капитального ремонта помещения столовой ФГ КОУ ВПО ВИ МВД России силами ООО «Новый дом» сообщая следующие:

Воронежским филиалом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» была проведена проверка в отношении исполнения Государственного контракта № 45 от 30.07.2012 между ООО «Новый дом» и Воронежским институтом МВД России.

Срок выполнения контракта – 28.09.2012г.

В ходе проверки выяснилось, что в процессе производства работ, выполняемых организацией ООО «Новый дом» возникло множество дополнительных работ, инициированных Заказчиком (работы по проведению электропроводки, установка автоматических выключателей, подключение оборудования напряжением 380 Вт, установка дополнительных светильников, выключателей и розеток, устройство перегородок из стекломагниевого листа в помещении №39 и №40 и другие виды дополнительных работ).

Все выполненные скрытые работы подтверждены и подписаны представителями ООО «Новый дом» и Воронежским институтом МВД России в Актах на скрытые работы.


Именно выполнение дополнительных работ, на необходимости которых и настаивали Ваши специалисты, привело к продлению фактического срока проведения капитального ремонта помещения столовой ФГ КОУ ВПО Воронежского института МВД России силами ООО «Новый дом».

3 октября 2012 г. был составлен и подписан с обеих сторон список замечаний, по устранению которых условия Государственного контракта № 45 от 30.07.2012 между ООО «Новый дом» и Воронежским институтом МВД России были бы выполнены.

26 октября 2012 г. все замечания, в соответствии с реестром замечаний, были устранены полностью, подписан протокол со стороны заказчика.

Учитывая вышеизложенное, НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» считает, что данный конфликт исчерпан, стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

**Президент
НП СРО МОСМО
«СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»**

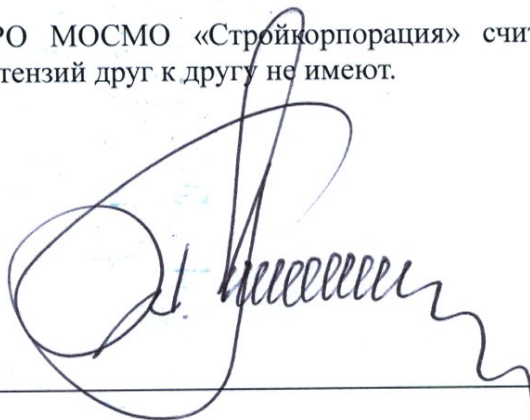

И.Э. Лукин

Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение
строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация»

141205, г. Пушкино, мкр. Междуречье, ул. Славянская, дом 2
Телефон / факс: +7 (495) 363-62-13
www.mosmo-sk.ru, lukin@stroycorp.com, psg@stroycorp.com
